



Le S^{ous}-Bassin

Bulletin trimestriel du PISEN - Numéro 009- Janvier-Mars 2026

DOSSIER : le PISEN au cœur de la réalisation du projet 3^e usine d'eau potable de Niamey avec le financement du lot 1 au lot 7 à hauteur de 105 milliards de Fcfa

Lot 1 : Usine de traitement et de pompage d'eau potable à Karey Gorou

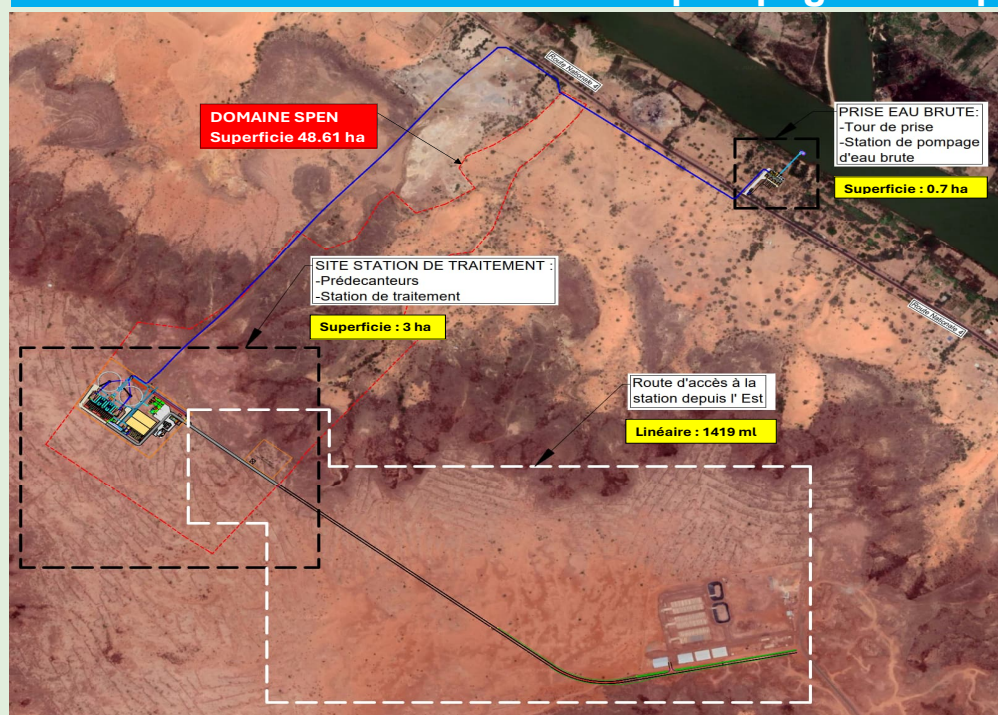

- ◆ **Un entretien exclusif avec le Coordonnateur National du PISEN M. Zibo Zakara sur les différents aspects du projet**
- ◆ **Lot 1 : tout part de Karey Gorou avec la prise d'eau brute et l'usine de traitement d'eau de 100 000 m³/jour**
- ◆ **Lots 2 et 3 : les travaux ont commencé**
- ◆ **Lots 6 et 7 : plus de 30% de pose de conduites d'eau réalisés**

Le mot de la Rédaction

En cette fin du 1^{er} trimestre de l'année 2026 nous pouvons affirmer que le PISEN est entrain d'atteindre sa vitesse de croisière pour répondre aux préoccupations des populations conformément à ses objectifs. Les actions concrètes posées comme le projet 3^e usine d'eau potable à Niamey phase 1 dont le PISEN finance sept (07) des dix (10) lots pour un montant de plus de 105 milliards de F CFA. Votre bulletin trimestriel **Le Sous Bassin** consacre tout un dossier pour expliquer comment cet appui financier s'est opéré tout en faisant le point sur l'évolution des travaux de chaque lot sur le terrain.

Ainsi, Niamey aura sa troisième usine d'eau potable à l'horizon 2028, tout comme elle disposera d'ici les mois à venir d'une deuxième Station de Traitement des Boues de Vidange totalement finalisée. Les travaux de finalisation ont déjà commencé pour un montant de près de 800 millions de FCFA.

Une autre action concrète dans toutes les zones d'intervention du PISEN, c'est la

réalisation de 390 Piézomètres pour une meilleure connaissance des ressources en Eau dans les 10 sous bassins sur quinze (15) que compte le pays. A ce niveau, le PISEN a mobilisé plus de 4 milliards 150 millions de FCFA. Les travaux de ces piézomètres démarrent incessamment. D'autres actions parallèles ont été menées et dont les résultats se feront connaitre avec le temps. Pour mieux savoir sur ces réalisations, suivez l'actualité du PISEN à travers le bulletin trimestriel **Le Sous Bassin** sans oublier les autres canaux d'information tels que :

-le site web : www.pisen.ne

-lapageFacebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61567808787034>

-la page YouTube : <https://www.linkedin.com/company/105414893/>

-la page LinkedIn : <https://www.youtube.com/@PISENNiger>

***Nous vous souhaitons
une bonne lecture !***

Le PISEN lance la réalisation de 390 Piézomètres pour améliorer la connaissance des ressources en Eau pour un montant de 4 milliards 150 millions de FCFA

Les travaux de réalisation des piézomètres répartis dans les dix (10) sous bassins versants du PISEN vont démarrer incessamment. A cet effet, une réunion de cadrage a regroupé le jeudi 02 Avril 2026 dans les locaux du PISEN les entreprises et groupements d'entreprises chargés des différents travaux, le PISEN mais aussi le Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui va assurer le suivi et le contrôle des travaux à travers les Directions Régionales de l'Hydraulique.

a-t-il dit, des défis qui se présentent à vous et qu'il faut relever dans la réalisation de ces piézomètres oh combien importants ! pour le PISEN mais surtout pour le ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui augmente ainsi son contrôle de ressource en eau.

Parmi ces défis, M. Zibo Zakara a cité le respect des délais contractuels et le risque d'arrêt des travaux avec bientôt le début de la saison des pluies avant d'exhorté les entreprises à fournir plus d'effort une fois sur le terrain afin d'anticiper les éventuels risques

Nombre de piézomètres par Entreprise et par sous-bassin

Lot	Entreprise Adjudicataire	Sous-bassin (Région)	Consistance des Travaux
1	Groupeement Dar Es Salam – Al Hayat	Dargol (Tillabéri)	36 Piézomètres conventionnels.
2	Groupeement I. KADA / BACOREX	Sirba (Tillabéri)	01 Piézomètre type et 43 conventionnels.
3	HYDRO-GENIE	Dallol Maouri et Dallol Bosso (Dosso)	40 Piézomètres types et 20 conventionnels.
4	Groupeement SNTC-SA / MAM HYDRAULIQUE	Maggia (Tahoua)	30 Piézomètres types et 10 conventionnels.
5	SAHEL HYDRAULIQUE	Basse Tarka (Tahoua)	20 Piézomètres types et 10 conventionnels.
6	Groupeement ESDP-SA / SAHA SARL	Telwa (Agadez)	33 Piézomètres types et 07 conventionnels.
7	SAM SERVICES	Goulbi (Maradi)	10 Piézomètres types et 20 conventionnels.
8	PREFOR NIGER	Goulbi N'kaba (Maradi)	19 Piézomètres types et 21 conventionnels.
9	Groupeement I. KADA / BACOREX	Korama (Zinder)	10 Piézomètres types et 20 conventionnels.
10	SONITA	Manga (Diffa)	30 Piézomètres types et 10 conventionnels.

C'est le Coordonnateur National du PISEN qui a présidé la réunion. Dans son intervention M. Zibo Zakara a félicité les entreprises et les groupements des entreprises sélectionnés à l'issue des différentes analyses sur le choix des meilleurs prestataires. C'est désormais,

liés à la saison des pluies.

Par la suite c'est un vrai échange qui s'est instauré entre les participants qui ont été d'abord édifiés sur le Projet PISEN, sa mission et surtout sur ce qui est de la consistance globale des travaux attendus.

Dans son intervention l'Expert Eau a situé le contexte de cette intervention spécifique qui est le renforcement du monitoring des données et de la gestion de l'information à travers la réalisation de 390 piézomètres. Toute chose qui vise à pallier les insuffisances en matière d'évaluation et de connaissance quantitative et qualitative des ressources en Eau. De manière opérationnelle a expliqué M. Rabé Sanoussi, il s'agit de mettre en place un réseau technique de surveillance pour fournir des outils de suivi précis du niveau des eaux souterraines aux acteurs locaux. Pour assurer ce monitoring, le projet prévoit la réalisation d'infrastructures de mesure

aménagement de surface type.

La préoccupation essentielle soulevée est principalement l'accessibilité aux sites sans crainte.

Dans ce sens une formation a été aussi organisée du 15 au 17 Avril 2026 à Dosso à l'endroit des cadres des entreprises pour renforcer les capacités du personnel des entreprises sur les exigences de sauvegarde environnementale, sociale et sécuritaire avec un focus sur la gestion de la sureté-sécurité personnelle notamment les consignes édictées par les autorités dans un contexte sécuritaire volatile. A l'issue des 3 jours d'échanges les participants ont beaucoup

Nombre d'aménagements et de sécurisations par sous-bassin

Sous-bassin	Total Aménagements de surface	Sécurisation Standard (Capot cadénassé)	Sécurisation Renforcée (Abri béton armé)
Dargol	36	36	-
Sirba	44	43	1
Dallol	60	20	40
Maggia	40	10	30
Basse Tarka	30	10	20
Telwa	40	7	33
Goulbi N'Maradi	30	20	10
Goulbi N'kaba	40	21	19
Korama	30	20	10
Manga	40	10	30
TOTAL	390	197	193*

dans dix (10) sous-bassins versants répartis sur sept régions du Niger. Les travaux comprendront la construction de trois cent quatre-vingt-dix (390) piézomètres, répartis techniquement comme suit :

197 piézomètres «types» avec sécurisation standard (Capot cadénassé).

193 piézomètres «conventionnels» avec sécurisation renforcée (Abri béton armé). Chaque ouvrage sera équipé d'un

appris sur le contexte sécuritaire national actuel, ce qui leur permet d'être plus prudents. Ils ont aussi approfondi leurs connaissances sur les exigences des autorités en matière de sécurité. Ils ont enfin adopté le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et le plan de campagne de communication.

Hamado Moumouni
SCGC/PISEN

Le PISEN lance les travaux de finalisation de la construction de la STBV2 de Niamey pour un montant de près de 800 millions de FCFA

La Station de Traitement des Boues de Vidange (STVB2) de Niamey situé à Karey Gorou/Arrondissement Communal Niamey 5 va être bientôt finalisée grâce au PISEN. Les travaux de finalisation du site ont déjà commencé. La réunion de cadrage suivie de la remise du site a eu lieu le 08 Avril 2026 en présence des représentants de la ville de Niamey, du Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de l'entreprise ASI-BF, du cabinet de contrôle EDE et de la coordination nationale du PISEN. Au cours de la réunion le coordonnateur National du PISEN M. Zibo Zakara a fait un bref rappel de l'histoire de la station qui a été construite en 2019 mais non achevée. Depuis lors, les infrastructures ont été vandalisées et d'autres ont subi des détériorations dues aux intempéries.

Tirant les leçons du passé, le Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement représenté par la Directrice Générale de l'Assainissement et du Cadre de Vie et le Coordonnateur National ont beaucoup insisté auprès de l'entreprise ASI-BF et du cabinet de contrôle EDE sur le fait que les travaux doivent impérativement être achevés dans les délais.

L'entreprise ASI/BF a donné les assurances

nécessaires sur la finalisation des travaux dans le délai imparti.

À l'issue de la réunion de cadrage, les participants se sont rendus sur le site pour la remise officielle dudit site à l'entreprise burkinabé ASI BF chargée des travaux. Une remise suivie de visite guidée qui a permis de constater l'état de dégradation des ouvrages. Les premiers travaux ont démarré et les vigiles sont sur place pour empêcher des nouveaux actes de vandalisme. Pour sa part le bureau de contrôle EDE présent sur le site a pris acte de la nécessité d'un suivi rigoureux des travaux afin de livrer à la ville de Niamey son infrastructure tant attendue pour l'amélioration de son cadre de vie.

Le contrat des travaux signé avec l'entreprise ASI-BF le 28 MAI 2025 est d'un montant d'un peu plus de 700 millions de F CFA pour un délai contractuel de dix (10) mois. Le contrat du bureau de contrôle confié à EDE (Sénégal) a été signé le 20 Janvier 2026 pour un montant de plus de 84 millions de F CFA avec un délai contractuel de quatre (4) mois « en temps passé ».

La STBV2 est une propriété de la ville de Niamey qui est en charge de sa gestion

Adamou Seydou Nassira Stagiaire au PISEN



Une vue de la STBV2

... le PISEN a connu quelques soubresauts qui ont failli compromettre son existence, mais, depuis l'arrivée du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), il a repris vie et mieux, aujourd'hui, il est le plus grand Projet pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et urbain. Le PISEN finance aussi des activités de restauration de l'environnement, de mobilisation des eaux, d'irrigation et de gestion intégrée des ressources en eau

Niamey, notre capitale, sera dotée à l'horizon 2028 d'une nouvelle usine d'eau potable dans le cadre du grand Projet de construction de la 3ème Usine de traitement et de production d'eau potable à Niamey/Karey Gorou Rive droite. La première phase de 100 000 M3 d'eau par jour est financée par l'Etat du Niger sur prêt de la Banque Mondiale à travers le PISEN à hauteur d'un peu plus de 105 milliards de FCFA. Le financement totalement acquis concerne principalement les lots 1,2,3,4,5,6 et 7.....

Ce numéro consacre tout un dossier qui explique les raisons de cette implication du PISEN, le niveau de réalisation et d'avancement de chaque lot mais avant pour avoir une vue d'ensemble nous vous proposons une interview du Coordonnateur National du PISEN M. Zibo Zakara qui en début d'année 2026 s'est confié au journal LA PATRIE. L'Entretien reproduit intégralement dans votre bulletin le SOUS BASSIN a porté sur les différents aspects de ce grand projet, notamment le financement, les entreprises recrutées ou encore les conditions de mise en œuvre...

La PATRIE : M. Zibo Zakara, vous êtes Ingénieur Géologue et Hydrogéologue, vous êtes aussi Coordonnateur National du Projet de Plateforme Intégrée pour la Sécurité de l'Eau au Niger (PISEN). En quelques mots, parlez-nous de ce Projet.

M. Zibo Zakara : LE PISEN Comme son nom l'indique, c'est un Projet qui a pour vocation d'assurer la sécurité de l'eau au Niger. Il est porté par le Gouvernement du Niger sous financement de la Banque Mondiale. Il a connu quelques soubresauts qui ont failli compromettre son existence, mais, depuis l'arrivée du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), il a repris vie et mieux, aujourd'hui, il est le plus grand Projet pour l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Niamey. Au-delà de l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain, le PISEN finance aussi l'alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural, l'appui à la recherche scientifique dans

le domaine de l'eau ainsi que des activités de restauration de l'environnement de mobilisation des eaux et d'irrigation et de gestion intégrée des ressources en eau dans 10 sous bassins sur les 15 principaux que compte le Niger

Permettez-moi à ce niveau de préciser, que la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), Société d'Etat est le maître d'œuvre et maître d'ouvrage de tous les investissements du sous-secteur de l'Hydraulique Urbaine, dont entre autres les investissements de ce projet de 3ème usine d'eau potable de Niamey, financé par le PISEN.

La PATRIE : Justement, parlant de ce projet de construction de la troisième usine d'eau potable pour la ville de Niamey, le projet semblait compromis avec le retrait de certains bailleurs de fonds dont la BEI, le RVO et l'AFD, suite aux événements du 26 juillet 2023.

M. Zibo Zakara : Le projet de la 3ème usine d'eau potable de Niamey est un investissement



M. Zibo Zakara, Coordonnateur National du PISEN

stratégique majeur visant à sécuriser durablement l'approvisionnement en eau potable de la ville de Niamey. Cette usine a une capacité de 100 000 m³/jour. C'est un projet qui, comme vous l'avez rappelé, était initialement financé par plusieurs bailleurs de fonds Européens et la Banque mondiale. Suite aux événements du 26 juillet 2023, certains bailleurs ont abandonné le Projet. Mais, ironie de l'histoire, le CNSP qu'on accuse d'avoir compromis ce Projet est aujourd'hui l'élément central de la reprise des activités entrant dans le cadre de la troisième usine d'eau potable de la ville de Niamey. En effet, c'est grâce aux efforts du CNSP, la volonté et la détermination de son Président, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l'Etat, et avec l'appui de la Banque Mondiale, ce gigantesque projet destiné à la ville de Niamey est sauvé. Ainsi, cette mission a été confiée au Projet de Plateforme Intégré pour la Sécurité de l'Eau au Niger (PISEN) qui a déjà trouvé l'essentiel du financement du projet de cette troisième usine de la ville de Niamey, soit un peu plus de 105 milliards. Ce financement est

reparti en dix (10) grands lots.

LA PATRIE : Quels sont ces dix (10) lots, et est-ce que le contenu local est pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet. Autrement dit, est-ce qu'il y a des entreprises nigériennes qui prennent part à la construction de cette usine ?

M. Zibo Zakara : Naturellement ! Les entreprises nigériennes sont parties prenantes dans ce projet de même que les bureaux d'études Nigériens. Ainsi, pour les Lots 1 et 2 qui portent sur la construction d'une prise d'eau brute et d'une usine de traitement d'eau potable d'une capacité de 100 000 m³/jour à Karey Gorou, et la fourniture, la pose de conduites de transfert en fonte (De diamètre nominale (DN) 400 à 1400 mm) sur une distance totale de 54 km, les travaux seront réalisés par le groupement des entreprises DENYS-SATOM avec DENYS comme chef de file pour le premier lot et SATOM pour le deuxième.

Le premier lot pour un montant de 64 925 387 125 FCFA. Le 2 février 2026, in sha Allah, interviendra le démarrage des travaux de ce lot avec la remise de l'Ordre de service (OS). Le délai d'exécution contractuel est de 30 mois, avec un démarrage effectif des travaux le 1er août 2026. La fin des

travaux est prévue le 31 juillet 2028. Ce délai que d'aucuns trouveront long s'explique par l'importance de la conception des ouvrages, de leur validation et la

«Le mérite d'avoir sauvé ce grand Projet de construction de l'usine d'eau potable à Niamey, revient à Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l'Etat », dit M. Zibo Zakara, Coordonnateur National du PISEN

durée de transports du matériel, et les différentes tractations au niveau des cordons douaniers (Benin-Nigéria-Niger).

Quant au deuxième lot, il est d'un montant de 29 684 798 316 FCFA TTC. Le démarrage des travaux interviendra le 2 février 2026 pour un

délai d'exécution contractuel de 28 mois et le démarrage effectif des travaux est prévu le 2 mai 2026. La date de fin des travaux, le 1er juin 2028. Pour les Lots 3, 4, 5 et 10, il est prévu la construction et la réhabilitation de plusieurs réservoirs. Ainsi, au niveau du Lot 3, il est prévu la construction de quatre (4) réservoirs dont un de 3 500m³, un autre sur tour R18 de 2500 m³ (route de Torodi plateau de Yawaré), un troisième R19 (5000 m³). Toujours dans ce Lot 3, il est prévu sur la route de Filingué, la construction d'un réservoir au sol de 4000 m³ pour renforcer l'alimentation en eau des réservoirs sur existants R12 et R16. Les coûts des travaux du lot 3 s'élèvent à 8 770 525 520 FCFA. Les travaux seront réalisés par le groupement d'entreprises CGC Int'l, PPI avec CGC Int'l comme chef de file. Leurs démarrages interviendront à partir du 1er février 2026 pour un délai d'exécution contractuel de 22 mois et le démarrage effectif des travaux est prévu le 1er avril 2026. La date de fin des travaux est prévue le 31 janvier 2028.

Pour le Lot 4, il est prévu la construction de deux

réservoirs sur tour de 2500m³ chacun. (R19 et R20) qui seront alimentés par la conduite qui sera posée dans les travaux du lot2. Cinquante-cinq (55) km de réseaux associés sont aussi prévus.

Lot 5 : Ouvrages et adduction Tranche 1 du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP). Il s'agit de la Construction d'un réservoir sur tour R8B (3000m³) au quartier Yantala, et renforcement des conduites d'adduction du quartier.

Lot 10 : Il s'agit de la réhabilitation de 11 réservoirs sur tour repartis dans la ville de Niamey. A ce niveau, il faut préciser que même si le Gouvernement n'a pas encore formellement adressé une requête à la Banque Mondiale pour leur financement, le montant estimé pour ces Lots s'élève à 20 800 000 000 FCFA.

En résumé, ce sont dix-sept (17) châteaux d'eau qui seront concernés, dont quatre (4) nouveaux à construire, 11 déjà existants à réhabiliter et deux réservoirs au sol à réaliser.

La PATRIE : Monsieur le Coordonnateur, on



Le Ministre Maizama recevant des explications sur le site de la prise d'eau de la 3è Usine au bord du fleuve Niger

remarque que tous les lots que vous venez d'évoquer sont certes des marchés octroyés et qui concernent surtout la construction de l'usine de traitement d'eau brute et celle des réservoirs qui n'ont pas encore débuté, qu'en est-il alors des travaux de canalisation devant amener l'eau dans les ménages ?

M. Zibo Zakara : Vous faites bien de le relever. En effet, les Lots 1, 2, 3, 4, 5 et 10 concernent effectivement la construction de l'usine de traitement des eaux elle-même, ainsi que son opérationnalisation par la pose des conduites et la construction et réfection des châteaux d'eau. L'ordre de service sera effectif le 2 février 2026, c'est-à-dire dans quelques jours. Par contre, les Lots 6 et 7 qui concernent les travaux de fourniture et pose des conduites de distribution d'eau potable, ont déjà démarré avec un taux d'exécution entre 26 et 27%.

Si on détaille le Lot 6, il concerne, comme je le disais tantôt, les travaux de fourniture et pose des conduites de distribution d'eau potable d'une longueur totale de 70,46 km pour la rive droite. Le coût total est de 5 989 713 799 FCFA TTC. Ces travaux sont réalisés par le groupement des entreprises nigéro-burkinabé ASI-BF/DARES SALAM avec ASI-BF comme chef de file. Le délai contractuel d'exécution de ces travaux est de 18 mois. Ils ont démarré le 14 juin 2025 et à la date du 31 décembre 2025, le taux d'exécution est de 26%.

Quant au Lot 7, il concerne la fourniture et pose des conduites de distribution d'eau potable d'une longueur totale de 627,040 km pour la rive gauche. Le montant s'élève à 18 176 929 426 FCFA TTC. Les travaux sont réalisés par le groupement des entreprises Algéro-Nigérien CHIALI SERVICES / MTK SERVICES avec CHIALI SERVICES comme chef de file. Le délai contractuel d'exécution de ces travaux est de 24 mois. Les travaux ont démarré le 16 juin 2025 et à la date du 31 décembre 2025, le taux d'exécution est de 27%.

Pour finir avec les Lots, il faut préciser que le lot 8 et le lot 9 portent sur les Branchements sociaux ; Bornes Fontaines et petites extensions dans les quartiers mal desservis et non desservis en adduction d'eau potable dans la ville de Niamey. Il est prévu 24 000 branchements sociaux pour la rive droite et 21 000 pour la rive gauche. Le marché devrait être négocié par entente directe entre la SPEN et le Fermier, la Nigérienne Des Eaux (NDE) pour un montant de 7,5 milliards de FCFA TTC.

La PATRIE : M. Zibo Zakara, on peut dire que vous êtes un Coordonnateur heureux, pour avoir sauvé un Projet en passe de sombrer et qui, aujourd'hui porte l'espoir des citoyens de la capitale, Niamey, de voir l'amélioration de la qualité et desserte de l'eau.

M. Zibo Zakara : Je crois plutôt que le mérite d'avoir sauvé ce grand Projet de construction de l'usine d'eau potable de Niamey, revient à Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l'Etat. C'est lui qui a cru à la nécessité de doter la ville de Niamey d'une troisième usine d'eau potable, c'est lui qui a impulsé la dynamique, c'est lui qui a autorisé la réorientation des différents accords de financement avec la Banque Mondiale, bref, c'est le politique qui a créé les conditions de faisabilité de cette usine. Les techniciens que nous sommes, conseillons et proposons. Pour la petite anecdote, (vous pouvez le constater en visitant les installations de la SPEN et de la NDE) les machines qui produisent l'eau potable à Niamey datent de 1952 et de 1963, elles sont post-coloniales. A l'heure de la Refondation et de la souveraineté, il est évident que nos autorités s'inscrivent et s'inscriront toujours dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations.

**Propos recueillis par
Traoré Amadou Daouda**

Lot 1 : Les travaux ont démarré le 30 mars 2026

Le Lot 1 est le cœur du Projet de 3^{ème} Usine d'Eau Potable de Karey Gorou (ville de Niamey) puisqu'il s'agit de la construction d'une prise d'eau brute et d'une usine de traitement d'eau potable. Le montant de ce marché est de près de 65 milliards de FCFA. Les travaux seront réalisés par le groupement des entreprises DENYS-SATOM avec DENYS comme chef de file pour un délai d'exécution contractuel de 30 mois. La date de fin des travaux est prévue le 31 juillet 2028.

Toutes les exigences contractuelles ont été remplies par le maître d'ouvrage qui est La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN). La remise officielle du site au groupement d'entreprises DENYS/SOGEA SATOM a eu lieu le mardi 03 février 2026.

La cérémonie de la remise s'est déroulée en présence des représentants de la SPEN, du groupement d'entreprises DENYS/SOGEA SATOM, du bureau de contrôle des travaux MERLIN/LAMCO et du projet PISEN qui finance ce lot 1. La remise des sites est une exigence contractuelle et consiste à remettre au groupement d'entreprises DENYS/SOGEA SATOM les différents sites où les ouvrages vont être érigés. Une remise des sites suivie de visites. Ainsi les parties

prenantes ont d'abord visité le site de la prise d'eau ainsi que la station de reprise le long du fleuve Niger, puis le site de construction de la station de traitement d'eau potable de 48 hectares. Autre site de taille, l'itinéraire de la ligne électrique qui sera construite dans le cadre du projet. Cette future ligne quitte l'usine de production d'électricité de Gorou Banda pour alimenter la station de reprise de Yawaré, ainsi que la station de traitement d'eau. En résumé les travaux vont consister en la réalisation :

- d'un ouvrage de prise d'eau brute pouvant satisfaire une capacité de production d'eau traitée de 250 000 m³/j
- d'une canalisation eau brute entre ouvrage de prise d'eau et station de pompage.
- d'une station de pompage d'eau brute (Exhaure)
- d'une canalisation de refoulement eau brute vers la station de traitement.
- d'une Station de traitement d'eau de 100 000 m³/j
- d'un système de télégestion et aux ouvrages d'alimentation électrique...

Haladou Laouali Amani
Chef de Projet Lot 1



Le site de la 3^{ème} Usine sur le plateau de Karey Gorou

Lot 2 : Fourniture et pose des conduites adductions principales de l'usine et refoulements R18/Filingué

Les travaux du Lot 2 portent sur la fourniture et la pose de conduites de transfert en fonte sur une longueur totale de 30 km. Il s'agit de la fourniture et Pose des Conduites d'Adductions principales de l'usine et de refoulement de R18/Filingué. Le montant des travaux du Lot 2 est estimé à 29 milliards 700 millions de francs CFA. Les travaux seront réalisés par le groupement des entreprises SATOM/DENYS avec SATOM comme chef de file pour un délai d'exécution contractuel de 28 mois.

L'ordre de service pour le démarrage des travaux a été signée le 05/03/2026 et la fin prévisionnelle desdits travaux est fixée au 05 juillet 2028.

C'est le mercredi 04 Février 2026 que la SPEN a remis officiellement à l'adjudicataire du marché du lot 2, le Groupement d'Entreprises SOGEA-SATOM/DENYS les sites des travaux à réaliser ce qui lui permet d'avoir un accès total et de prendre possession des sites des travaux en vue de rendre possible la réalisation effective desdits travaux. Au cours de ladite mission de remise officielle des sites des travaux, les équipes du Maître d'Ouvrage (SPEN), du PISEN, du bureau de contrôle MERLIN/LAMCO et du groupement d'entreprises ont pu d'abord visiter le tracé (itinéraire) intégral de la conduite transfert des eaux produites à partir de la 3ème usine (qui sera construite). La visite a principalement porté sur les sites des différents ouvrages de stockage des eaux comme la station de reprise de Yowaré, le château d'eau R18 de Yowaré plateau, le



Le site du château d'eau R18 de Yowaré plateau

château d'eau R11 (A et B) de la rive droite et enfin la station de reprise de route Filingué.

Les travaux vont notamment consister en la :

- Fourniture et pose de 1 669 ml de canalisation en fonte C30 DN400 ;
- Fourniture et pose de 40 ml de canalisation en fonte C30 DN500 ;
- Fourniture et pose de 6 859 ml de canalisation en fonte C30 DN600 ;
- Fourniture et pose de 2 898 ml de canalisation en fonte C30 DN800 ;
- Fourniture et pose de 538 ml de canalisation en fonte C30 DN1 000 ;
- Fourniture et pose de 5 232 ml de canalisation en fonte C30 DN1 200 ;
- Fourniture et pose de 11 532 ml de canalisation en fonte C30 DN1 400 ;
- Fourniture et pose de 1 295 ml de canalisation en fonte C30 DN1 600 ;
- Construction et équipement de 54 regards en béton de vannes, ventouses et vidange ;
- Planification et réalisation des activités de sauvegarde environnementale et sociale.

Djibrilla Karimou Daouda
Chef de Projets Lot 2 et Lot 3 (SPEN)

Lot 3 : Construction d'Ouvrages de stockage et de reprise aux sites Route Filingué, Yowaré et R18

Le lot 3 consiste en la Construction et l'équipement d'ouvrages de stockage et de reprise aux sites de Yowaré, Yowaré plateau et de la Route Filingué

Ces travaux prévoient la construction et l'équipement d'une station de reprise et d'un réservoir au sol de 3 500m³ à Yowaré, d'un réservoir sur tour R18 de 2500 m³ à Yowaré plateau, tous situés sur la route Torodi pour renforcer l'alimentation en eau des populations de l'arrondissement communal 5.

Aussi, il est prévu sur la route de Filingué, la construction et l'équipement d'une station de reprise, et d'un réservoir au sol de 4000 m³ pour renforcer l'alimentation en eau des réservoirs existants R12 et R16 du quartier Niamey. Le montant des travaux s'élève à plus de 8milliards 700 millions de FCFA. Les travaux seront réalisés par le groupement des entreprises CGC Int'l/PPI avec CGC Int'l comme chef de file pour un délai d'exécution contractuel de 22 mois.

L'ordre de service pour le démarrage des travaux a été signée le 13/03/2026 et la fin prévisionnelle desdits travaux est fixée au 13 janvier 2028.

C'est le jeudi 05 février 2026 que la SPEN a officiellement remis à l'adjudataire du marché du Lot 3, le Groupement d'Entreprises CGCINT/PPI, les sites des ouvrages à réaliser. Ce sont des ouvrages de stockage et de reprise prévus sur

les sites de Yowaré, Yowaré plateau et de la route Filingué. Dans le cadre de cette remise officielle des sites, les équipes ont pu visiter les principaux sites en commençant par le site du R18A (Yowaré plateau), celui de la station de reprise de 3 500m³ (Yowaré), tous situés sur la route Torodi à la rive droite et enfin le site de Yowaré rive droite qui accueillera la station de reprise et enfin le site de filingué rive gauche.

Les travaux vont consister en la :

- Construction et équipements d'une station de reprise et d'un réservoir au sol de 3 500 m³ à Yowaré;
- Construction et équipement d'un château d'eau (R18A) à Yowaré d'une capacité de 2 500 m³;
- Construction et équipements d'un réservoir au sol sur la route Filingué d'une capacité de 4 000 m³ ;
- Construction et équipement à Yowaré d'une station de reprise, équipée de (2+1) pompes de 750 m³ /h et HMT=74mCE chacune et en la construction et équipement sur la route Filingué d'une station de reprise, équipée de (1+1) pompes de 646 m³ /h et HMT=58mCE chacune et (1+1) pompes de 588 m³ /h et HMT=78mCE chacune.

Djibrilla Karimou Daouda

Chef de Projets Lot 2 et Lot 3 (SPEN)



La base vie du groupement des entreprises CGC Int'l/PPI à Yowaré

Lot 6 : fourniture et pose de conduites d'eau à la rive droite

Le Lot 6 consiste en la fourniture et pose des conduites de distribution à la rive droite conduits par le groupement d'entreprises ASI BF (Burkina Faso) /DAR ES SALAM (Niger) les travaux ont démarré le 14 juin 2025 pour un délai contractuel de 18 mois. Il s'agit de poser 54,260 km linéaire de tuyaux PEHD et 16,200 km linéaires de tuyaux en FD (Fonte ductile), soit un total de 70,460 km linéaires

En termes de fourniture de tuyaux et pièces de raccordement, à la fin Mars 2026, le groupement d'entreprises ASI BF et DAR ES SALAM a commandé toute la quantité de tuyaux soit les 70,460 km à l'usine mais n'a réceptionné que 36,972 km sur le terrain. 10 conteneurs de FD sont arrivés à Lomé et prêts à être acheminés à Niamey. 33,360 km sur les 54,260 km de tuyaux PEHD (61.48%) et 3,612 km sur 16,200 km en fonte ductile soit 22.30% sont réceptionnés.

Une partie de fourniture de pièces spéciales (vannes de sectionnements, ventouses, cônes réducteurs...) a été réceptionné

Les travaux de pose de conduite ont accusé un léger retard au démarrage. Un rythme soutenu par un nombre d'équipes conséquent, a permis à partir du 06 décembre 2025 de commencer dans le quartier SAGUIA Plateau puis la zone de Karey Gorou, Kirkissoye et Cité des enseignants chercheurs dans la commune 5 de Niamey. Le rythme de l'avancement des travaux de pose des tuyaux est faible au démarrage qui est dû

au temps de soudure des tuyaux PEHD (environ 45mn pour les diamètres 160). Un linéaire de 18 446 ml de tuyaux a été posé.

En termes de consommation de délai, sur les 18 mois de délai l'entreprise a consommé avec un taux de 9.60 mois soit 53% du délai contractuel. Le taux d'exécution physique pondéré (fourniture et pose) de 44% pour un total de linéaire posé équivalent à 14.6 km en fin mars, soit un taux de conduite posée de 21%.

Maman Sani Oumarou Ingénieur hydraulicien Cabinet de Contrôle CIRA SAS (Mali)/SRI SARL (Niger)



Sur un chantier de pose de conduites d'eau à la rive droite

Lot 7 : fourniture et pose des conduites d'eau à la rive gauche

Les travaux sont conduits par le groupement d'entreprises CHIALI Service (Algérie) / MTK Services (Niger) pour une durée de 24 mois. Date de démarrage contractuel, le 16 juin 2025. Les travaux de fourniture et pose de conduite PEHD sont estimés autour de 627,530 km linéaire et la conduite en Fonte Ductile est estimée à 18,510 km linéaires pour un linéaire total de 646,040 km linéaires.

Les diamètres varient de 600 à 350 mm pour les tuyaux en FD et de 315 à 63 mm pour le PEHD.

En termes de fourniture de tuyaux et pièces de raccordement, Le groupement d'entreprises CHIALI et MTK a commandé et réceptionné sur site à Niamey, la totalité de la quantité de conduite en fonte ductile qui vient de la Chine soit 18,510 km (100%) ; Pour le PEHD, l'entreprise le fabrique elle-même par l'une de ses filiales en Algérie, et le ravitaillement sur site se fait au besoin de l'avancement des travaux. Sur un total de 627,530 km, à la fin du mois de mars, 188,772 km de tuyaux représentant 30% de la quantité totale a été livré. Un prochain ravitaillement de 90 km de tuyaux est attendu.

En termes de fourniture de pièces spéciales (vannes de sectionnements, ventouses, cônes réducteurs...) pour le lot 7, la quantité des pièces totales est réceptionnée.

En termes de démarrage des travaux de pose de conduite : pour le lot 7, la pose des tuyaux a commencé par les secteurs 8 et 9 dans l'arrondissement communal IV et 100% des besoins en tuyaux PEHD pour couvrir ces zones soit 119,262 km de tuyaux sont réceptionnés. Pour les secteurs 10 et 11 respectivement Niamey 2000 et route Fillingue, le linéaire total de conduite est réceptionné sur site et les travaux de pose sont en cours. La pose des conduites a réellement commencé, le 02 Novembre 2025 dans le quartier Aéroport, commune 4 de Niamey. L'avancement des travaux sur les tronçons démarrés a été entravé par la présence d'encombrement de réseaux concessionnaires diverses (trois fibres optiques de Airtel, Moov et Niger télécom, deux câbles



Un chantier de pose de conduites d'eau à la rive gauche

MT de la NIGELEC, deux conduites d'eaux de la NDE). A cela, s'ajoute les travaux du ministère de l'équipement à savoir sur la RN1 et la RN18 route Fillingué dont certains tronçons sont soit en parallèle à ces ouvrages ou les coupent perpendiculairement. Sur quatre mois de travail et avec 8 équipes d'une vingtaine d'ouvriers et engins mécaniques, l'entreprise est à 158 321ml de pose de conduite tous diamètres confondus.

En termes de consommation de délai : sur les 24 mois de travaux, l'entreprise en a consommé 9,50 mois (40% du délai contractuel) avec un taux d'exécution physique pondère (fourniture et pose) de 31%. Le taux de pose de réseau est estimé à 22%.

Maman Sani Oumarou Ingénieur hydraulicien Cabinet de Contrôle CIRA SAS (Mali)/SRI SARL (Niger)

3ème usine d'eau potable de Niamey

Le Ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Colonel Maizama Abdoulaye visite le site de l'usine et le site de la prise d'eau

Le Colonel MAIZAMA Abdoulaye est allé voir, le vendredi 20 février 2026, comment évoluent les travaux du chantier de la 3ème Usine d'eau potable qui est le cœur du grand projet de production d'eau potable, de renforcement et d'extension des réseaux d'alimentation en Eau potable de la ville de Niamey. Les lieux visités : le site de l'usine à Karey Gorou et le site de la prise d'eau situé au bord du fleuve Niger.

Des visites ponctuées de présentation des ouvrages, d'échanges francs sur l'évolution du dossier et des questions de fond sur la réalisation de l'usine dans les délais impartis. Pour la réussite du projet dans son ensemble le Ministre MAIZAMA a insisté sur la responsabilité de chaque acteur de la chaîne



La délégation ministérielle sur le site de la 3è usine/Plateau Karey Gorou

à faire ce qu'il doit faire dans le délai qui lui est accordé. Pour cela, il a préconisé de mettre en place un dispositif de suivi évaluation pour faire le point de façon régulière et pouvoir mettre chacun devant les faits. « Ce dispositif est essentiel dans l'appréciation de l'avancée des différents travaux y compris les autres lots qui composent le projet. Car,

a insisté le ministre, les autorités au plus haut niveau accorde un intérêt particulier à ce projet 3ème usine de production d'eau potable dédiée à la ville de Niamey » Un projet de 10 lots dont le Lot 1 porte sur la construction d'une prise d'eau brute et d'une usine de traitement d'eau potable d'une capacité de 100 000 m³/jour à Karey Gorou. Le montant de la construction de l'usine s'élève à près de 65 Milliards de FCFA.



Le ministre recevant des explications sur le site de la prise d'eau au bord du Fleuve Niger

Hamado Moumouni
SCGC.PISEN

Le PISEN dote ses ONG partenaires d'outils de collecte des données

La tutelle du PISEN représentée par M. Ali Abdoukadi Abdoullaye du Cabinet du Premier Ministre et Le Coordonnateur National du PISEN Monsieur Zibo Zakara ont procédé le samedi 14 mars 2026 à Konni à une cérémonie de remise officielle d'outils de collecte des données principalement des smartphones aux différentes ONG partenaires du projet chargées de la mise en place des organes GIRE et de l'Engagement Citoyen dans les zones d'intervention du PISEN. Cette cérémonie fait suite à une formation de ces ONG sur la collecte des données numériques. Au total soixante-dix (70) smartphones ont été remis aux différents représentants des ONG dont huit (08) pour l'ONG DEMIE E intervenant dans la région d'Agadez, huit (08) à l'ONG ESE (Diffa)



M Ali Abdoukadi Abdoullaye (à gauche) remettant au représentant de l'ONG DEMIE E son matériel de collecte de données vingt-six (26) au Consortium KARKARA/IVDES à Dosso, huit (08) à l'ONG GSC Tamakon Manoma(Maradi) douze (12) à l'ONG ADLI (Tillabéry) et huit (08) autres à l'ONG ADL(Zinder) ...

Les deux responsables ont appelé les ONG à utiliser convenablement ces appareils. « Nous recommandons aux ONG de faire un travail de qualité sur le terrain et d'utiliser les appareils à bon escient afin de rendre service

aux communautés en remontant des données fiables sur leurs perceptions de la réalité du terrain» a souligné le Coordonnateur National du PISEN M. Zibo Zakara

Le représentant du cabinet du Premier Ministre a pour sa part insisté sur l'engagement des ONG : « Votre engagement a-t-il insisté est une condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs du projet PISEN».



Le Coordonnateur National du PISEN (à droite) remettant aux représentants des ONG ADLI...

Dans le même temps se déroulait l'atelier de formation des formateurs de ces ONG partenaires, des cadres de l'UGP en charge de l'Engagement Citoyen et de la Gire sur l'utilisation d'outils numériques pour la collecte des données et l'utilisation de la plateforme Kobotoolbox.

Pendant 5 jours les participants ont été formés sur la plateforme Kobotoolbox et à l'utilisation de l'application ODK collecte pour télécharger et renseigner un formulaire à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette numérique. Ils ont aussi adapté les fiches standards de suivi communautaire aux différentes infrastructures devant faire l'objet de suivi communautaire et digitalisation des fiches. Cette formation entre dans le cadre de la série de formation entreprise par le projet PISEN à l'endroit de ces ONG chargées de la mise en place des organes GIRE et de l'Engagement Citoyen.



... ESE...

Le contexte sécuritaire passé en revue

Comme en pareille circonstance l'Expert Sécurité s'est aussi entretenu avec les participants sur la situation sécuritaire dans le pays. M. Bagagi Djibrina a d'abord développé le contexte sécuritaire général, puis expliqué les stratégies possibles pour y faire face avec le plus de mitigations possibles. Il a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs du projet de collaborer avec les autorités administratives sur l'accessibilité des sites d'activités



Il a aussi mis l'accent sur les principes fondamentaux de sécurité guidés par la vigilance permanente, la discrétion dans les lieux, le profil bas, la communication régulière et le respect strict des procédures. Des principes que tout un chacun doit appliquer pour mieux se protéger.

Boubacar Mahamadou
Spécialiste Suivi-Evaluation
PISEN

... et consortium KARKARA/IVDES leurs matériels de collecte de données

La Direction Générale de l'Agriculture (DGA) forme ses cadres avec l'appui du PISEN

La Direction Générale de l'Agriculture à travers la Direction de l'Inspection et du Contrôle des Engrais (DICE) a organisé du 6 au 9 mars 2026 à Konni un atelier de renforcement des capacités de ces cadres issus des zones d'intervention du projet PISEN.

La formation a pour objectif de renforcer les capacités

des inspecteurs des engrais et encadreurs (Chefs de Districts Agricole) sur les pratiques agricoles susceptibles de préserver durablement le sol et les ressources en eau, la typologie des engrais et l'utilisation efficiente des nutriments.

Ainsi trente (30) cadres ont été formés sur les différentes thématiques de pratiques agricoles susceptibles de pré-

server durablement le sol et les ressources en eau et tenir compte des fertilisants de type nouveau au Niger (Bokashi, engrais liquide, etc.).

Ces participants ont aussi mis en place un réseau d'échanges continu en matière de gestion de la fertilité des sols (des groupes d'échanges WhatsApp pour diffuser les informations sur la gestion des sols et des nutriments).

La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du Directeur Général de l'Agriculture et le spécialiste Agroéconomiste, représentant le Coordonnateur National du PISEN et du Spécialiste Agroéconomiste du



Des séances de démonstration...

Le Sous-Bassin

BULLETIN TRIMESTRIEL DU PISEN

Adresse : Quartier Bobiel

Boulevard Muhammad Buhari

Tel : + 227 20 37 08 71 / 90 87 95 06

Niamey-Niger

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Zibo Zakara

Coordonnateur National/PISEN

REDACTEUR EN CHEF

Hamado Moumouni

SCGC/PISEN

COMPOSITION :

Inoussa Oumarou

PISEN Namata Issa Mamane qui au nom du Coordonnateur National a surtout exhorté les participants à plus d'assiduité, d'échanges et de concentration pendant la formation.

Le DGA Aboubacar Ibrahima Danda a pour sa part souligné l'importance et l'intérêt combien important que chaque participant se doit de porter afin d'enrichir ses connaissances et de pouvoir les restituer aux réels bénéficiaires qui sont les producteurs relais et les producteurs de la zone d'intervention du projet.

Plusieurs modules ont fait l'objet d'échanges entre les techniciens notamment la technique de production de l'engrais organique le Bokashi, la technique de production du biofertilisant le Bastol, la RNA et défrichage améliorée ou encore la Gestion intégrée de fertilité de sol (GIFS).

De retour dans leurs localités respectives, les 20 CDA formés sous la supervision des



... pendant la formation

inspecteurs régionaux des engrais auront en charge l'animation des sessions de formation de deux cent (200) producteurs relais avec un ration de dix (10) producteurs relais/CDA. Les deux cent (200) producteurs relais vont former à leur tour, sept mille (7 000) producteurs avec un ratio de trente (35) producteurs / producteurs relais formés au niveau des communes bénéficiaires.



... des pratiques agricoles...

Namata Issa Mamane

Spécialiste Agroéconomiste UGP/PISEN

«Parler d'égalité face à l'eau, c'est affirmer qu'aucune communauté, aucun enfant, aucune femme, aucun homme ne devrait être laissé de côté en raison de son lieu de résidence, de sa situation économique ou de sa vulnérabilité. C'est reconnaître que l'accès équitable à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène est essentiel pour réduire les disparités territoriales et sociales, renforcer la cohésion et améliorer durablement les conditions de vie des populations».

Informations clés



Durée du Projet

7 ans (14 Octobre 2021 - 29 Decembre 2028)



Financement

Banque Mondiale



Tutelle

Cabinet du Premier Ministre



Structures d'exécution

- 1 UGP (Unité de Gestion de Projet) à Niamey,
- 7 UCR (Unités de Coordinations régionales) à Agadez, Maradi, Tahoua, Diffa, Dosso, Zinder, Tillabery



Structures d'accompagnement à l'exécution

- Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement
- Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publiques
- Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN)



Quartier Bobiel

Boulevard Muhammad Buhari



+ 227 20 37 08 71 - 90 87 95 06

Site web : www.pisen.ne

Niamey - Niger

