



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Le S^{ous}-Bassin

Bulletin trimestriel du PISEN - Numéro 10- Avril-Juin 2026

Mission d'appui Gouvernement/Banque Mondiale au projet PISEN du 1^{er} au 12 juin 2026



La mission satisfaite des résultats du projet et encourage les acteurs à continuer dans cette lancée

Le Ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement visite des réalisations du PISEN dans les régions de Maradi et Diffa



Le mot du Coordonnateur National

Ce numéro 10 de votre bulletin trimestriel le « SOUS BASSIN » consacre un dossier sur la mission conjointe Gouvernement/Banque Mondiale pour l'appui technique au PISEN, c'était du 1^{er} au 12 juin 2026. La mission a apprécié avec satisfaction la mise en œuvre du projet et a encouragé les acteurs à aller de l'avant. Autre fait marquant de ce trimestre nous avons reçu la visite du Ministre de l'Environnement de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le Colonel Abdoullaye Maizama nous a fait l'honneur par deux fois de visiter diverses réalisations en cours du PISEN comme le site de Demi-Lune Agricole à Dan Rago, le site de piézomètre conventionnel de Iyataoua dans la région de Maradi et le château d'eau presque achevé de la ville de Diffa. Nous nous réjouissons de telles visites d'une structure d'accompagnement comme le Ministère de l'Environnement de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MEHA), le MEHA désormais notre tutelle technique depuis le 24 juin 2026 suite à un décret du Président de la République. Nous vous ferons aussi le point sur les activités de la Gestion Durable des Terres (GDT) dont les résultats du deuxième appel à proposition sont connus. Quelques 311 sous projets ont été retenus pour différentes pratiques pour le traitement de terres au moyen de Demies-Lunes Agricoles (DLA), Demies Lunes Sylvo-



M. Zibo Zakara

Pastorales (DLSP), du faucardage ou encore de la Régénération Naturelle Assistée (RNA). Près de 30 000 hectares doivent être récupérées.

Bien d'autres actualités qui ont rythmé la vie du projet au cours du trimestre vous seront rapportées.

Comme à chaque occasion et cela pour donner plus d'échos aux actions du PISEN, je vous invite à lire et à faire lire le bulletin d'information le « SOUS BASSIN ».

N'oubliez pas aussi les autres canaux d'information tels que :

-le site web : www.pisen.ne

-la page Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=61567808787034>

-la page YouTube : <https://www.linkedin.com/company/105414893/>

-la page LinkedIn : <https://www.youtube.com/@PISENNiger>

Bonne lecture

En mission dans la région de Maradi, le Ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement visite des réalisations du PISEN

Le Ministre Maizama Abdoullaye accompagné d'une forte délégation dont le Gouverneur de la région de Maradi le Contrôleur Général Issoufou Mamane a d'abord visité le site de piézomètre conventionnel en cours de réalisation à Iyataoua dans la commune urbaine de Tessaoua grâce au projet PISEN. En effet dans le cadre de l'amélioration des connaissances des ressources en eau, le PISEN est entrain de réaliser actuellement soixante-dix (70) piézomètres dans les sous bassins du Goulbi N Kaba et du Goulbi Maradi. Au total il est prévu au titre de cette année 2026 la réalisation de 390 piézomètres sur l'ensemble des dix (10) sous bassins dans lequel le PISEN intervient.

Autre réalisation du PISEN que la délégation a visité le site de récupération des terres de Dan Rago Sabon Gari dans la commune urbaine d'Aguié. L'ouvrage est une Demi-Lune Agricole d'une superficie de 40 Hectares pour un montant de plus de 13700 000 FCFA. Avec l'implication effective des populations le site de Dan Rago est un exemple cité en matière de récupération de sites.

Autre visite le site de la Station de Traitement des Boues de Vidange (STBV) que le PISEN va construire pour la ville de Maradi. La première



Le Ministre Abdoullaye Maizama recevant des explications sur la réalisation du piézomètre de Iyataoua

STBV de Maradi sera construite sur une superficie d'environ dix (10) hectares à l'extrémité Est de l'Arrondissement Communal III de Maradi à la limite de la Commune Rurale de Djirataoua. Elle devra permettre de contribuer de mieux réguler la gestion des boues de vidange et d'améliorer le cadre de vie de ses populations, par une gestion mieux organisée et plus efficiente de la filière de gestion des boues de vidange.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement Abdoullaye Maizama s'est réjoui des réalisations opérées par le PISEN et a encouragé le PISEN à faire davantage pour le bonheur des populations, lesquelles doivent être pleinement impliquées à toutes les étapes des réalisations des différents ouvrages.



Une vue du site de demi-lune agricole de Dan Rago

Mohamed Laakizab Anouar
Assistant Passation des Marchés/PISEN Maradi

Le Ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement visite le chantier de construction du second château d'eau de la ville de Diffa.

Accompagné du Secrétaire général de la région de Diffa, des autorités administratives et coutumières, des responsables régionaux des Forces de défense et de sécurité (FDS), des services techniques déconcentrés ainsi que des responsables du Projet de Plateforme Intégrée pour la Sécurité de l'Eau au Niger (PISEN), le Colonel Abdoulaye Maizama a visité le chantier de construction du second château d'eau de la ville de Diffa financé par le projet PISEN et exécuté par l'entreprise nigérienne DIDI Global Construction. D'une capacité de 1 200 mètres cubes, cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Diffa. Selon les responsables de l'Entreprise, les travaux affichent un taux d'exécution physique d'environ 78 %, tandis que le taux de décaissement est estimé à 45 % du montant contractuel. La réception de l'infrastructure est prévue pour le mois de septembre prochain.

Après avoir reçu des explications détaillées sur




Le Ministre et sa délégation sur le site de construction du château

l'état d'avancement des travaux et effectué une visite complète du site, le Ministre Abdoulaye Maizama s'est dit satisfait de la progression du chantier, une réalisation emblématique de la desserte en eau des populations de la région de Diffa, financée par le PISEN. Il a aussi souligné que tous les équipements nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage sont déjà disponibles sur le chantier, et assure que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions.

« Nous ne pouvons que nous en féliciter et souhaiter revenir ici pour la réception de ce joyau qui, sans doute, nous permet d'affirmer que la Refondation est bien en marche dans tous les domaines », a-t-il déclaré. Le Colonel Abdoulaye Maizama a également insisté sur l'importance que les plus hautes autorités accordent à ce projet, soulignant la nécessité de respecter les délais contractuels et les normes de qualité.

« Le Chef de l'État tient beaucoup à cœur ce projet et nous le suivons de très près pour qu'il soit achevé dans le délai contractuel. Les travaux sont exécutés par une entreprise 100 % nigérienne et nous ne doutons aucunement de l'expertise de DIDI Global Construction », a-t-il ajouté.

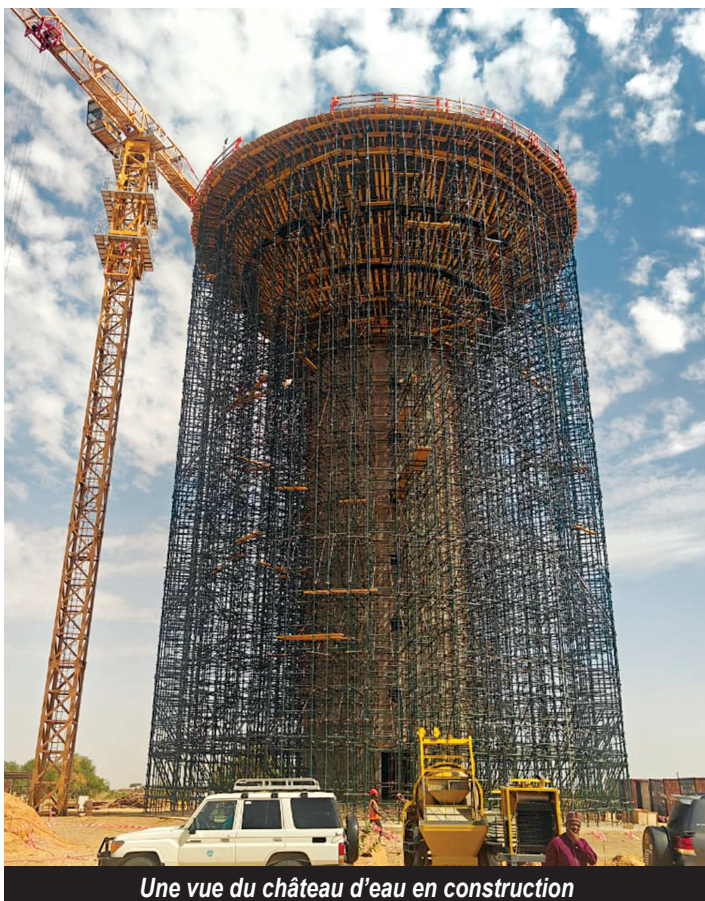

Une vue du château d'eau en construction

Saadou Mahamadou
Assistant Suivi-Evaluation/PISEN Diffa

Autonomisation des femmes au Niger

Le PISEN fait don de kits d'autonomisation économique à des groupements féminins de ses zones d'intervention

C'est la Ministre de la Population, de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale qui a présidé la cérémonie officiellement de réception des kits d'autonomisation économique

Le don est composé de 10 moulins à grain avec moteurs diesel ; 10 chessoirs triples actions (solaires, gaz et électricité) ; 10 torrificateurs à gaz ; 10 fours à gaz ; 30 bouteilles à gaz de 12 kilos ; 10 marmites ; 10 seaux plastiques ; 10 décortiqueuses ; et 10 presse-huile. Il fait partie des activités inscrites par le Ministère chargé de l'Action Sociale, dans le PTBA 2026 du PISEN. Le don fait suite à une mission d'identification qui a permis de cibler les groupements féminins ayant le plus besoin d'un accompagnement en matériels de travail.

La remise du don a fait l'objet, ce mercredi 22 Juillet 2026, d'une importante cérémonie présidée par la Ministre en charge de l'Action Sociale, Pr Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni, en présence notamment de Monsieur Zibo Zakara, Coordonnateur National du PISEN,

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Pr Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni a souligné que les kits qui leur sont remis représentent des outils



... à la Ministre de la Population

de travail, des moyens de production et surtout des instruments d'espoir et d'émancipation pour les femmes bénéficiaires. Pour elle, la présente cérémonie traduit de manière concrète leur engagement commun en faveur de l'autonomisation économique des femmes, de la promotion de leur participation au développement et de l'amélioration des conditions de vie des communautés.

Le Coordonnateur National du PISEN Monsieur Zibo zakara, quant à lui, a tenu à préciser le rôle et les missions assignés au PISEN par le Gouvernement, rôle et missions concourent à l'autonomisation économique des femmes. C'est du reste pourquoi, a-t-il précisé, le choix des kits a été bien ciblé par les services techniques du Ministère chargé de l'action sociale en fonction des besoins spécifiques des bénéficiaires. Il a enfin assuré de la volonté de sa structure à multiplier les efforts dans l'accompagnement des groupements féminins bénéficiaires afin d'accroître leur productivité et contribuer efficacement au développement local.



Présentation des kits...

**Moutari Daoudouka Point focal
du MP/AS/SN au PISEN**

Mission d'appui Gouvernement/Banque Mondiale au projet PISEN du 1^{er} au 12 juin 2026

La mission satisfaite de la mise en œuvre du projet avec un taux de décaissement global qui a progressé de 15 % (novembre 2025) à 35 % (mai 2026)

Que des avancées en effet en l'espace de 6 mois le taux de décaissement global a progressé de 15 % (novembre 2025) à 35 % (mai 2026) et le taux d'exécution financière du PTBA 2026 s'établit à 44 % après seulement quatre mois de mise en œuvre. Satisfaite, la mission relève la notation du projet à modérément satisfaisant en reconnaissance des progrès réalisés depuis la mission précédente. Ce taux de décaissement global de 35 % porté par le démarrage effectif des grands contrats de la troisième usine de Niamey et l'accélération des marchés de forages. Un autre bond c'est le taux

d'exécution financière du PTBA 2026 qui s'établit à 44 % après seulement quatre mois de mise en œuvre, ce qui constitue un signal encourageant par rapport aux exercices précédents. Par la voix du chef de mission, la mission félicite l'équipe gouvernementale par rapport aux résultats atteints entre les deux missions consécutives celle du 27 octobre au 07 novembre 2025 à celle de juin 2026. Il y a 1 an de cela relève M. Mohamed Nanzoul le projet était noté modérément insatisfaisant en termes de performance mais en l'espace de six (6) mois les choses ont nettement évolué avec des résultats satisfaisants et appréciés pour un projet

d'une grande envergure comme le PISEN, il y a lieu vraiment de féliciter les acteurs de mise en œuvre. Nous les encourageons à garder le cap sinon à faire mieux encore pour que cette progression se confirme davantage dans les mois à venir avec plus de résultats.

La mission a surtout constaté des avancées significatives dans la mise en œuvre des travaux de la troisième usine de traitement d'eau potable de Niamey, notamment l'atteinte des taux d'exécution physique de 44 % et 41 % respectivement pour les Lots 6 et 7.

La Rédaction



Une vue de l'assistance au lancement des activités de la mission

Quelques recommandations

■ La mission relève que la situation financière du projet appelle une attention particulière. Au regard des ressources encore disponibles, des engagements contractuels déjà souscrits, ainsi que des activités financées dans le cadre du PISEN à la demande du Gouvernement alors qu'elles n'étaient pas prévues initialement, les ressources résiduelles ne permettront vraisemblablement pas de couvrir l'ensemble des activités restantes. Dans ce contexte, un besoin de financement additionnel pourrait être constaté, dont le montant gagnerait à être précisé par le projet et le Gouvernement. La mission invite le Gouvernement, dans la mesure du possible d'ici au 15 juillet 2026, à confirmer l'orientation qu'il souhaiterait retenir pour la suite du projet, soit par la mobilisation de ressources additionnelles afin de couvrir le déficit de financement, soit par un recentrage du projet sur les activités prioritaires pouvant être financées sur les ressources résiduelles disponibles. Cette orientation permettrait à la Banque mondiale d'examiner, en concertation avec le Gouvernement, les suites institutionnelles à envisager.

■ La mission note que les Lots 8, 9 et 10 de la troisième usine de traitement d'eau potable de Niamey, qui revêtent une importance particulière pour l'atteinte des objectifs de développement du projet (ODP), ne disposent pas encore d'un financement identifié. Dans ce contexte, elle invite le Gouvernement à examiner, dans les meilleurs délais, les options susceptibles de permettre la mobilisation des ressources nécessaires, afin de préserver la pleine fonctionnalité du système de production et de distribution d'eau potable de Niamey.

Un extrait de l'Aide Mémoire de la mission conjointe

Brèves-Brèves-Brèves

Le PISEN sous tutelle technique du Ministère de l'Environnement de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Le PISEN est désormais sous la tutelle technique du Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est un décret du Président de la République, Chef de l'Etat le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, en date du 24 Juin 2026, qui notifie cette décision. Jusqu'à cette date la tutelle du PISEN est assurée par le cabinet du Premier Ministre.

Promotion de la GIRE au Niger : le gouvernement adopte le nouveau code de l'Eau

Le Niger a un nouveau code de l'Eau. Il a été adopté lors du conseil de ministres du 26 juin 2026. En effet après évaluation de la mise en œuvre du code de l'eau actuellement en vigueur, institué par l'ordonnance n 2010-09 du 1er avril 2010 ; le ministère en charge de l'hydraulique a relevé plusieurs insuffisances notamment la non prise en compte dans le dispositif de certains principes de gestion des ressources en eau et de protection de l'environnement. Le Code de l'Eau constitue un enjeu important pour la mise en place des organes institutionnels de la GIRE et pour la pérennisation des investissements financés par le PISEN dans ce domaine. C'est pourquoi La mission d'appui GVT BM au PISEN du 1° au 12 juin avait formulé une importante recommandation allant dans le sens de son adoption dans les meilleurs délais.

Rassemblées par Mme Oumalher, stagiaire Service Communication/PISEN

Les visites de la mission conjointe d'appui au PISEN : Niamey, 1^{ère} étape

Dès le 02 juin la 1^{ère} étape fut la ville de Niamey pour apprécier l'évolution des travaux de construction de la 3^e usine d'eau potable dont la phase 1 d'une capacité de 100 000 m³ d'eau par jour. Financée par le PISEN à hauteur de 187 milliards de F CFA cette phase 1 va permettre de sécuriser l'alimentation en eau de la ville de Niamey jusqu'à l'horizon 2035.

C'est une forte délégation composée des représentants du gouvernement, de la Banque Mondiale, de l'Unité de gestion du PISEN, de la SPEN et des entreprises qui s'est mobilisée ce mardi 02 Juin pour visiter différents ouvrages. La délégation s'est d'abord rendue à la rive droite Karey Gorou sur le site de la prise d'eau de l'usine puis sur le site de l'usine proprement dite, Yawaré où les réservoirs d'eau seront installés et la rive gauche (zone diaspora) pour les travaux de pose de canalisation du lot 7. La visite terrain a permis aux acteurs et partenaires de voir la réalité des réalisations et apprécier positivement le niveau de la qualité des travaux et de l'avis général : Tout avance normalement.

Le chef de projet Lot1 SPEN, Monsieur Haladou Laouali Aminou confirme devant les visiteurs qu'à la date du 02 Juin : « tout ce qui est mobilisation, et installation du chantier est en cours : la collecte des données, les études topographiques, les études géotechniques sont déjà réalisées. » et d'ajouter c'est l'un des projets jamais réalisé en termes de mobilisation et renforcement des capacités en eau potable, projet à l'issue duquel les populations de Niamey vont constater un vrai changement dans la distribution en eau potable avec environ 45 000 branchements sociaux attendus. »

Le Coordonnateur National du PISEN Monsieur Zibo Zakara relève pour sa part : « les



La mission conjointe sur le site de la 3^e usine d'eau potable de Karey Gorou

travaux ont certes connu une certaine léthargie mais aujourd'hui ils font l'objet d'un véritable démarrage citant les travaux de la prise d'eau et sur le plateau de Yawaré avec des équipes mobilisées. Au niveau des lots 6 et 7 nous constatons que les engins sont en train de faire les excavations, les entreprises utilisent aussi la haute intensité de main d'œuvre à travers les sous-traitances et l'utilisation du personnel national sur place et qui bénéficient aussi des retombées du projet ».

Le chef de mission de la Banque Mondiale Monsieur Mohamed Nanzoul : « Nous trouvons très appréciable l'avancement des travaux sur le terrain notamment avec les installations de la 3^e usine qui sont à un stade avancé. Il faut surtout retenir que c'est un groupement d'entreprises qui s'occupe de la conception et de la réalisation des travaux. Actuellement nous sommes au stade de conception c'est pour cela que les installations physiques ne sont pas très visibles et cela va prendre quelque temps pour répondre à nos attentes c'est-à-dire que les populations aient à de l'eau de qualité. Nous pouvons assurer que la Banque Mondiale continuera à accompagner les efforts du gouvernement nigérien au bénéfice du bien-être des populations. »

**Hamado Moumouni
SCGC PISEN**

Région de Diffa : 2^e étape de la mission

La mission s'est rendue les 3 et 4 juin 2026 dans la région de Diffa pour évaluer l'état des systèmes d'AEP. Des travaux engagés par le PISEN, on retient pour la ville de Diffa la construction d'un château d'eau R2 de 1 200 m³ et à N'Guigmi, la réception provisoire des deux (2) châteaux d'eau métalliques de 500 m³ chacun, ainsi que des murs de clôture du champ de captage, qui a été prononcée le 7 mars 2026, après des travaux de confortement structurel réalisés en décembre 2025 ; toutefois, des prestations de finition et d'équipement restent à achever pour assurer la pleine fonctionnalité de l'ouvrage.

C'est d'abord un accueil chaleureux de la part des services techniques et des autorités régionales avec à leur tête le Gouverneur le Général de Division Ibrahim Bagadoma. Après échange sur le programme de travail, cap sur le site de construction du château d'eau R2 de 1 200 m³. Un château presque fini car à la date du 30 mai 2026, il affichait un taux d'exécution de 74,75 %. Toute chose qui réjouit les visiteurs à commencer par Le gouverneur de la région de Diffa

Le Général de Division Ibrahim Bagadoma « les travaux avancent normalement.

Nous avons fait le tour du site .le matériel de travail est disponible , toutes les équipes de travail sont là .Bref, tout est mis en œuvre et tout le monde est à pied d'œuvre pour un bon déroulement des travaux dans le délais impartis .Toutefois il faut souligner que les travaux ont pris un léger retard en raison des horaires contraignants de travail et cela s'explique par la situation sécuritaire de la ville de Diffa qui ne permet pas de relayer les équipes jour et nuit pour poursuivre les travaux. En tant que Gouverneur, nous avons pris acte et nous allons apporter les corrections nécessaires pour permettre à l'entreprise, une entreprise locale, de finir ces travaux sinon dans les délais en tout cas avec le minimum de retard possible. »

Autre réaction celle du **Chef de mission Banque Mondiale M Monsieur Mohamed Nanzoul** : « nous sommes impressionnés, pour une entreprise locale, de la qualité du travail et de la mobilisation des équipes sur le terrain. La seule contrainte relevée c'est celle des horaires de travail dont le Gouverneur a promis de trouver rapidement la solution. Nous sommes donc rassurés car avec un peu de volonté et la mobilisation de l'entreprise les délais seront tenus et nous pensons que l'ouvrage qui sera livré le sera avec toute la qualité requise. »

La mission tout comme les autorités régionales ont insisté sur la finalisation et l'opérationnalisation des systèmes d'AEP de Diffa et de N'Guigmi qui constituent une priorité absolue pour l'atteinte des objectifs du projet dans la région.

Hamado Moumouni
SCGC PISEN



Le Gouverneur de la région et les membres de la mission recevant des explications sur l'évolution du chantier

Investissements du PISEN : la région de Diffa est loin d'être en reste

Les différentes interventions sont opérées principalement dans le sous bassin du Manga, il a été réalisé : Ainsi dans le domaine de la gestion durable des terres (GDT) au titre de l'année 2025, Quarante-cinq (44) sous projets de fixation de dunes, de récupération des terres dégradées à travers la confection des demi-lunes sylvo-pastorales, de lutte contre les plantes envahissantes terrestres portés par 14 ONG pour une superficie totale de 3998.8

ha sur une prévision de 4035,6 ha soit un taux de réalisation de 99%. En termes de réalisation financière pour la mise en œuvre de la GDT 2025 quelque 1 milliard, 1 820 107 774 FCFA ont été mobilisés.

Au titre de l'année 2026, vingt-huit (28) nouveaux sous projets de fixation de dunes sont en cours de réalisation sur 1337,5 ha pour un montant total de 852 257 134 FCFA. Des investissements également pour mieux connaître la ressource en eau avec la réalisation en cours de 43 piézomètres pour améliorer la connaissance des ressources en Eau souterraines. D'autres réalisations en cours les infrastructures hydrauliques. il s'agit notamment de 43 forages AEP/ Assainissement, 12 puits cimentés pastoraux, 02 Adductions d'eau potable AEP multivillages, 07 mini AEP simples, 09 forages de pompage pastoral.

Le PISEN en tant que projet multisectoriel intervient dans plusieurs secteurs comme la lutte contre l'insécurité alimentaire, le programme grande irrigation ou encore la réalisation de la digue de protection de la



Une vue de deux châteaux d'eau de la ville de N'Guigmi ville de Diffa.

Le PISEN a aussi hérité des travaux non achevés du PARCA. C'est à cet effet qu'il finance l'extension du système d'Adduction en Eau Potable (AEP) dans les villes de Diffa et N'guigmi à plus de trois milliards deux cent quatre-vingt-sept millions (3 297 000 000) FCFA. Cette extension consiste à : -finaliser les travaux de renforcement du système d'AEP de la ville de Diffa - Construction du château d'eau R2 en béton armé de 1200m3 de Diffa

-finaliser les travaux de construction de deux (02) bâches d'eau et réhabilitation du château R1 de la ville de Diffa et à mener -des travaux de renforcement du système d'AEP de la ville de Nguigmi - finalisation des travaux de construction de deux châteaux métalliques de 500m3 de la ville de Nguigmi -des travaux de renforcement du système d'AEP de la ville de Nguigmi - construction des murs de clôture du champ de captage du site des château d'eau de la ville de Nguigmi.

Saadou Mahamadou
Assistant Suivi-Evaluation/PISEN Diffa

Atelier de validation des rapports provisoires sur l'état des lieux des structures de gouvernance des points d'eau d'abreuvement et le diagnostic des conflits liés à l'utilisation d'eau d'abreuvement dans cinq (5) sous bassins du PISEN

Dans le cadre du partenariat qui lie le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MAGEL) au Projet pour la Sécurité de l'Eau au Niger (PISEN), la Direction Générale du développement Pastoral, de la Production et des Industries Animales (DGDPPA), a conduit une étude diagnostique des conflits liés à l'utilisation des points d'eau pour l'abreuvement du bétail et l'état des lieux des structures de gouvernance des points d'eau dans les cinq (5) sous bassins du PISEN. Il s'agit de Dallol Maori (Dosso), la Maggia et la Vaste Vallée de la Tarka (Tahoua), la Korama (Zinder) et le Manga (Diffa). C'est le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l'Agriculture et de l'élevage, Dr Laouali Ali qui a présidé les travaux de l'atelier qui a validé les deux rapports en présence de plusieurs structures concernées.

Il ressort des présentations des résultats de l'étude diagnostique que 302 conflits ont été identifiés au niveau de 220 localités situées dans 44 communes. 229/302 conflits ont été enregistrés au niveau des sous bassin Manga et Dallol Maouri avec respectivement 115/302 et 114/302 conflits. Ces conflits sont particulièrement observés dans les zones à faible maillage en point d'eau pastoraux, dans les zones aux difficultés d'exhaure du

fait de la profondeur de niveau de captage lui-même lié à l'abaissement des nappes phréatiques, dans les zones à faible prise en charge de l'entretien des ouvrages réalisés et dans les zones à insuffisance des structures de gouvernance des infrastructures pastorales. En effet, sur les 803 points d'eau répertoriés dans les cinq (5) sous bassin, l'étude révèle que 76% des points d'eau ne possèdent pas de structure de gestion. Ce manque est de 47% pour les puits cimentés villageois et 17% pour les puits cimentés pastoraux. Aussi, 63 % des structures de gestion n'ont pas de textes organiques (statuts ou règlement intérieur) et 37% en disposent. Ce qui révèle un déficit de structuration. Enfin, 78% des structures de gestion n'ont pas de documents de gestion (cahier de caisse, registres) seulement 22% en disposent. D'où la nécessité de redynamiser, renforcer les capacités des structures de gestion dans les sous bassins du PISEN et réaliser / réhabiliter les points d'eau pastoraux modernes dans les sous bassins du PISEN.

Dr HAROUNA AYOUBA,
Ditecteur de l'Aménagement,
de la Sécurisation des espaces Pastoraux et de la
Mobilité Pastorale.



Photo de famille des participants à l'atelier

La GDT toujours au cœur des interventions du PISEN

Les résultats du deuxième appel à proposition pour les activités de récupération des terres sont connus. Quelques 311 sous projets ont été retenus pour le traitement de terres au moyen de Demies-Lunes Agricoles (DLA), le traitement de terres au moyen de Demies Lunes Sylvo- Pastorales (DLSP), la Fixation des dunes Lutte Contre les Plantes Envahissantes Terrestres (LCPET), le faucardage, la valorisation des espèces envahissantes aquatiques ou encore la pratique de la Régénération Naturelle Assistée (RNA). Près de 30 000 hectares doivent être récupérées. L'Expert Environnement du PISEN tire le bilan du premier appel de 2025 et les leçons à retenir pour mieux réussir ce deuxième appel.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Sous Composante 1.2 : relative à la «Restaurationdesenvironnementsdesbassinsversants», il est encours d'exécution 530 sous-projets de Gestion Durable des Terres (GDT) à travers la signature des conventions avec des ONG et Associations de développement dans les 10 sous-bassins d'intervention du PISEN. Ces sous-projets totalisent une superficie de 50 519 ha répartis comme suit :

	Nombre de sous-projets	Superficie par type d'activité de GDT (ha)						Traitement biologique de koris
		Traitement de terres au moyen de Demies-Lunes Agricoles (DLA)	Traitement de terres au moyen de Demies Lunes Sylvo-Pastorales (DLSP)	Fixation des dunes	Lutte Contre les Plantes Envahissant es Terrestres (LCPET)	Faucardage et la valorisation des espèces envahissantes aquatiques	Pratique de la Régénération Naturelle Assistée (RNA)	
Premier appel à proposition	219	4 021	6 387	3 179	3 118	77	3 738	160
Deuxième appel à proposition	311	4 661	7 905	1 808	5 792	209	9 463	-
Total	530	8 682	14 292	4 987	8 910	286	13 201	160

Dans le cadre de la mise en œuvre des sous-projets du premier appel, plus de 15 000 hectares de terres ont été traités sur une prévision de 20680 ha, soit un taux de réalisation de 76 %. Grâce à ces activités, 20 034 ménages ont été touchés par les investissements avec 81 695 bénéficiaires direct dont 35 206 femmes.

La mise en œuvre des sous-projets du premier appel a mis en lumière des défis cruciaux ayant nécessité des ajustements techniques et stratégiques. Le renforcement des capacités, l'anticipation des retards administratifs et un suivi plus soutenu constituent les fondements indispensables pour garantir la réussite et l'impact des activités du deuxième appel qui viennent de démarrer.

Pour ainsi maximiser les chances de succès des sous-projets récemment lancés, plusieurs mesures ont été mises en œuvre. A titre d'exemple, nous pouvons citer :

L'Organisation d'un atelier de cadrage : des sessions d'ateliers régionaux ont été organisées en présence de l'ensemble des acteurs à savoir les ONG/AD, les services techniques déconcentrés chargés du suivi à tous les niveaux (Région, département et

commune) et les autorités communales. Ces ateliers à double vocation ont permis non seulement de clarifier les responsabilités des acteurs mais également de renforcer leurs capacités sur des thématiques variées, notamment le transfert des compétences aux commune, le reporting du projet, les exigences fiduciaires dès la phase de démarrage ;

La Signature d'une convention de partenariat avec la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) : Ladite Convention a pour objectif d'assurer une bonne exécution technique des sous-projets de Gestion Durable des Terres conformément aux normes édictées par le Ministère en charge de l'Environnement et aux dispositions des conventions de leur mise en œuvre. A travers ce partenariat, les services techniques de l'environnement assurent le contrôle de conformité et l'assurance qualité des activités GDT et la Digitalisation du suivi: Mise en place d'outils numériques pour un reporting plus fluide et une évaluation en temps réel des progrès, permettant des alertes précoces en cas de déviation.

Hamani Adamou,
Expert Environnement PISEN



Un jardin de manioc fertilisé grâce au compost du site de Zarma Koira dans le sous bassin de la Sirba

Une équipe de l'UGP/PISEN en mission de redynamisation et de renforcement des capacités des comités MGP des communes des sous bassins du GOULBI Maradi et de la KOROMA

L'équipe composée du spécialiste sauvegarde sociale/GIS et de la spécialiste VBG, avec l'appui des UCR PISEN et du représentant du PAN-GIRE a effectué du 13 au 26 Mai 2026 des missions dans les sous bassins du Goulbi Maradi (région de Maradi) et du 30 Mai au 12 JUIN dans les sous bassins de la Koroma (Zinder). Des missions pour rendre opérationnels les différents comités du Mécanisme de Gestion des installés depuis 2023 mais pas actifs sur le terrain. Il s'agit principalement de redynamiser les Comités MGP mis en place en 2023 dans le sous bassin de

Goulbi Maradi (Région de Maradi) et dans le sous bassin de la Koroma (Région de Zinder), à travers le remplacement des membres absents ou non disponibles.

C'est aussi l'occasion de sensibiliser les communautés sur le but du Mécanisme de Gestion des Plaintes, d'expliquer les procédures de traitement des plaintes et les rôles des différents acteurs, d'expliquer les procédures spécifiques pour le recueil et traitement des plaintes EAS/HS et l'approche centrée sur les survivant-es (y compris l'existence de protocole de référence-ment vers les services de prise en charge VBG à Maradi et Zinder).

Une autre exigence que la mission s'est donnée c'est celle d'identifier une femme dans chaque comité qui sera le point focal chargée du recueil des plaintes EAS/HS et de passer en revue le rôle, et les limites du rôle de ce point focal, concernant les procédures des plaintes EAS/HS.

La mission procédera aussi au renforcement des capacités des membres des comités communaux de gestion des plaintes mis en place, sur l'enregistrement des plaintes et dotera les comités des principaux documents pour leur fonctionnement.



Photo de famille à l'issue des échanges

Le Sous-Bassin

BULLETIN TRIMESTRIEL DU PISEN

Adresse : Quartier Bobiel

Boulevard Muhammad Buhari

Tel : + 227 20 37 08 71 / 90 87 95 06

Niamey-Niger

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Zibo Zakara

Coordonnateur National/PISEN

REDACTEUR EN CHEF

Hamado Moumouni

SCGC/PISEN

COMPOSITION :

Inoussa Oumarou



Remise de kits MGP

Pour l'étape de Maradi douze (12) Chefs-lieux de communes du sous bassin de Goulbi sont concernées. Il s'agit des communes de Dan Issa, Djirataoua, Gabi, Madarounfa, Safo, Sarkin Yamma, Chadakori, Guidan Roundji, Guidan Sori, Saé Saboua, Tibiri et l'Arrondissement Communal 1 de Maradi.

La seconde étape, Zinder avec onze (11) chefs-lieux de communes : Dungass, Goutchi, Malawa, Guidimouni, Magaria, Bandé, Dantchiao, Kwaya, Sassoumbroum, Yekoua et Wacha.

Les autorités administratives et coutumières mobilisées

Un constat s'impose celui de la mobilisation des autorités administratives et coutumières qui, à toutes les étapes sont mobilisés au côté de la mission. Les Préfets, les Administrateurs Délégués et chefs de canton ont répondu présents

dans toutes les communes sillonnées en vue de donner du poids au message de la mission et pour qu'au besoin les différentes plaintes relatives à la mise en œuvre du projet puissent être traitées selon le processus retenu.

Le mécanisme de gestion des plaintes est un ensemble de structures, de procédures et processus par lesquels les plaintes, les questions sur le projet, ainsi que les problèmes qui surgissent dans sa mise en œuvre sont résolus, tout en visant la gestion des plaintes, les procédures de résolution, l'information sur les possibilités de recours. Ce mécanisme est établi afin d'assurer la gestion des éventuelles plaintes des bénéficiaires et autres parties prenantes dans les zones d'intervention du projet

Balkissa Diallo Spécialiste VBG/PISEN

Informations clés



Durée du Projet

7 ans (14 octobre 2021-29 décembre 2028)



Financement

Banque Mondiale



Tutelle

- Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement



Structures d'exécution

- 1 UGP (Unité de Gestion de Projet) à Niamey
- 7 UCR (Unités de Coordinations régionales) à Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder



Structures d'accompagnement à l'exécution

- Ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement
- Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publiques
- Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN)



Quartier Bobiel

Boulevard Muhammad Buhari



+ 227 20 37 08 71 - 90 87 95 06

Site web : www.pisen.ne

Niamey - Niger

